




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>

PLANO GERAL DE PROJETO - PGP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
Projeto	Acessibilidade do Voto	Processo administrativo nº 0001357-42.2018.6.25.8000	
Alinhamento Estratégico	Macrodesafio Garantia dos Direitos da Cidadania		
Gestor do Macrodesafio	Presidente do Comitê Gestor das Cartas de Serviços de 1º e 2º Grau		
Patrocinador	Rubens Lisboa Maciel Filho	Comissão/Unidade Patrocinadora	DG
Líder do Projeto	Marcelo Gerard Almeida de Andrade		
Programa vinculado	Programa Eleições 2018		
Clientes	Eleitores e sociedade em geral		
Custo Total Estimado			

2. VISÃO GERAL DO PROJETO
2.1 Justificativa do Projeto: Além de garantir a continuidade das ações determinadas pelo Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, Resolução TSE nº 23.381/2012, este projeto contribuirá com o alcance do objetivo do Macrodesafio de Garantia dos Direitos da Cidadania do Planejamento Estratégico do TRE-SE 215-2020, qual seja, a garantia dos direitos do cidadão-eleitor, facilitando o exercício do voto e aprimorando o acesso e a qualidade dos serviços da Justiça Eleitoral.
2.2 Objetivo: a) Disponibilizar aos Juízos Eleitorais modelo de avaliação dos locais de votação quanto aos critérios de acessibilidade; b) Realizar levantamento dos locais de votação com menor acessibilidade, de modo a subsidiar a adoção de medidas e/ou o estabelecimento de parcerias; c) Estruturar no Sistema de Pré-Eleição os dados avaliados na vistoria dos locais de votação, inclusive quanto à acessibilidade, emitindo-se relatórios gerenciais; d) Verificar a existência de eleitores deficientes físicos de locomoção nestes locais e informar aos Juízos Eleitorais com o objetivo de oportunizar a mudança do local de votação; e) Fomentar o cadastro de mesários voluntários com conhecimento em Libras; f) Identificar e disponibilizar fones de ouvido nas seções eleitorais em que há deficiente visual cadastrado.

3. ESCOPO DO PROJETO
3.1 Dentro do Escopo: a) Avaliação dos locais de votação; b) Aquisição e disponibilização de fones de ouvido; c) Capacitação em libras.
3.2 Fora do Escopo: a) Ações ligadas ao Cadastro Eleitoral, que serão incluídas no escopo do projeto Cadastro, do Programa Eleições 2018; b) Acessibilidade Digital e Acessibilidade dos prédios da Justiça Eleitoral, que serão tratadas em projetos específicos.
3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP):

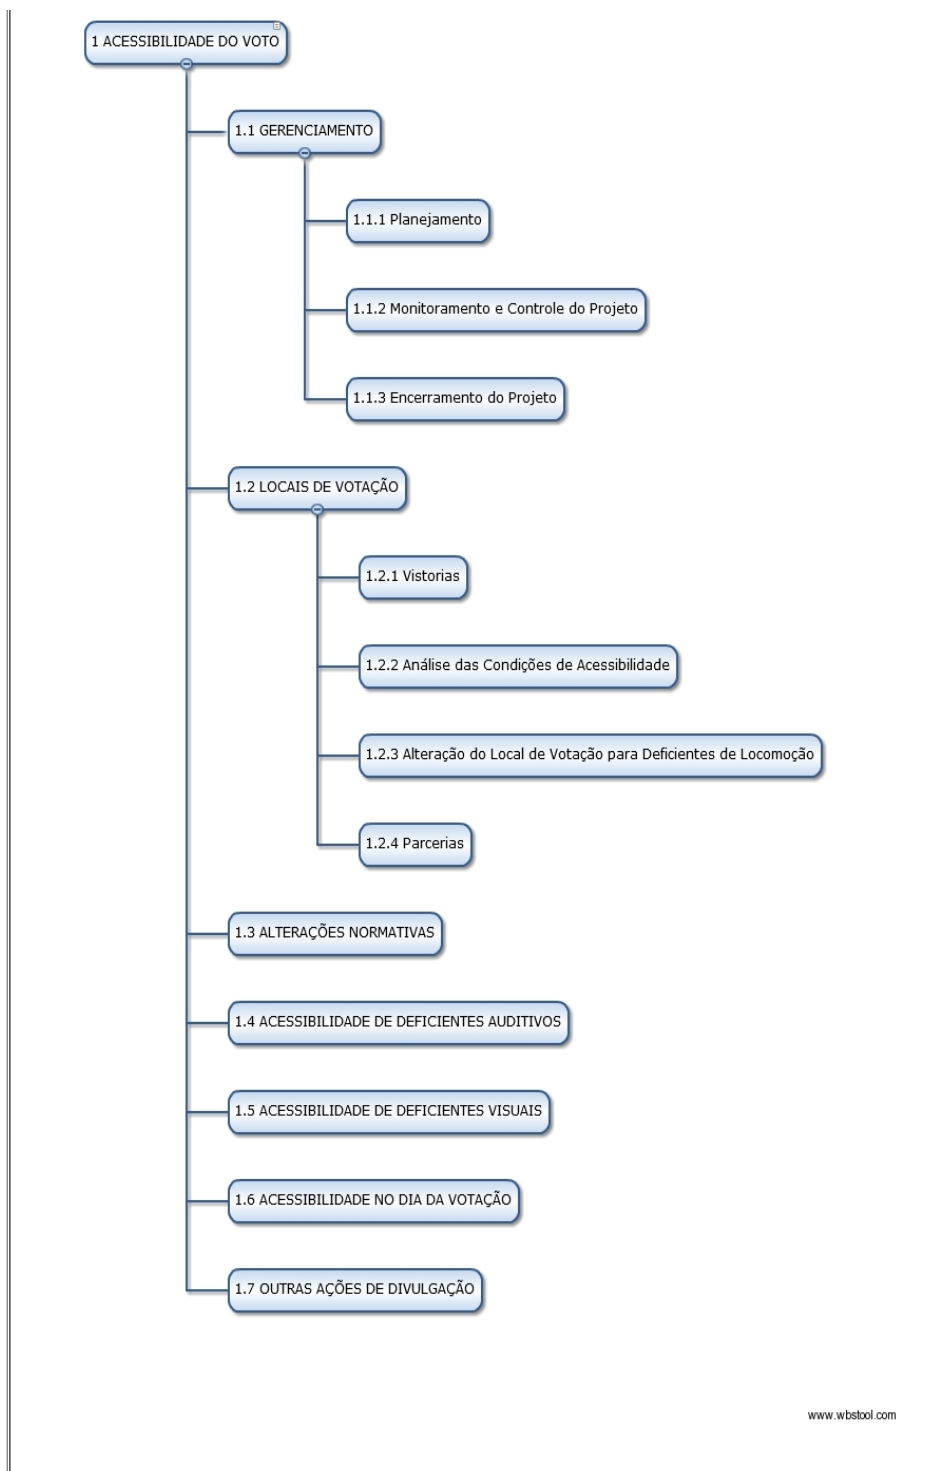

4. CRONOGRAMA DETALHADO			
Etapas	Cronograma		Responsável
	Início	Término	
GERENCIAMENTO			
Planejamento -Elaboração do Projeto	01/02/18	09/04/18	LÍDER DO PROJETO
Monitoramento e Controle do projeto -Atas de reuniões -Atualizações de versões do PGP -Acompanhamento orçamentário	09/04/2018	28/10/18	LÍDER DO PROJETO
Encerramento do Projeto -Elaboração do TEP	29/10/18	30/11/18	LÍDER DO PROJETO

LOCAIS DE VOTAÇÃO			EQUIPE DO PROJETO
Vistorias			
Estudar e propor, se necessário, alteração dos critérios de classificação de acessibilidade para os locais de votação. -Utilizar os parâmetros definidos no formulário de vistoria dos locais de votação, com o foco no acesso dos deficientes físicos de locomoção.	09/04/2018	29/06/2018	EQUIPE DO PROJETO
Acompanhar a execução das atividades previstas no calendário de vistorias junto às Zonas Eleitorais, inclusive o cadastro das informações dos locais de votação no Pré-eleição.	09/04/2018	06/10/2018	EQUIPE DO PROJETO
Análise das Condições de Acessibilidade			
Analisar as informações fornecidas pelos Cartórios Eleitorais, após a primeira fase de vistorias.	13/04/2018	04/05/2018	EQUIPE DO PROJETO
Acompanhar o encaminhamento dos pedidos de ajustes dos locais de votação.	13/04/2018	08/06/2018	EQUIPE DO PROJETO
Analisar as informações fornecidas pelos Cartórios Eleitorais, após a segunda fase de vistorias.	11/06/2018	29/06/2019	EQUIPE DO PROJETO
Acompanhar o encaminhamento dos ofícios aos órgãos responsáveis pelos locais de votação e as comunicações ao Ministério Público.	11/06/2018	29/06/2019	EQUIPE DO PROJETO
Informar aos Cartórios a necessidade de verificar se há eleitor com deficiência em seção eleitoral que não tem a necessária acessibilidade.	09/05/2018	30/05/2018	EQUIPE DO PROJETO
Parcerias			EQUIPE DO PROJETO
Expedir ofício da Presidência solicitando aos Juízes Eleitorais informações sobre o estabelecimento de parcerias visando à melhoria das condições de acessibilidade dos locais de votação.	09/05/2018	30/05/2018	EQUIPE DO PROJETO
ALTERAÇÕES NORMATIVAS			EQUIPE DO PROJETO
Avaliar oportunidades de melhorias na Resolução que tratará sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos para as Eleições 2018 (Resolução 34/2014 - Capítulo II - Seção IV - Acessibilidade Física do Eleitor).	01/02/18	09/04/2018	EQUIPE DO PROJETO
Propor ajustes na Resolução, se necessário.	01/02/18	09/04/2018	EQUIPE DO PROJETO
ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES AUDITIVOS			EQUIPE DO PROJETO
Levantar, junto à STI, as seções eleitores com deficiente auditivo no cadastro.	01/02/18	09/02/2018	EQUIPE DO PROJETO
Levantar os cursos de capacitação em libras a serem promovidos em Aracaju e	09/05/2018	30/05/2018	EQUIPE DO PROJETO

realizar ação de divulgação para cadastro de mesários voluntários.			
Realizar ação de divulgação envolvendo a ASCOM, para fomentar o cadastro de mesários com conhecimento em libras.	01/02/18	30/05/2018	EQUIPE DO PROJETO
ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES VISUAIS			EQUIPE DO PROJETO
Levantar o quantitativo de fones de ouvido necessários para aquisição. Envolve: - o levantamento de seções eleitorais e locais de votação com deficiente auditivo cadastrado; - levantar o estoque de fones de ouvido existentes e o teste por amostragem; - considerar a recomendação da Resolução de Atos preparatórios do TSE e estatística do Analog nas Eleições 2016, se possível.	01/02/18	09/02/2018	EQUIPE DO PROJETO
Especificar, em parceria com a STI, o fone de ouvido objetivando solicitar sua aquisição.	12/02/2018	15/02/2018	EQUIPE DO PROJETO
Solicitar à SAO aquisição de fones de ouvido.	16/02/2018	02/03/2018	EQUIPE DO PROJETO
Acompanhar o processo licitatório de aquisição de fones até o fornecimento.	02/03/2018	27/07/2018	EQUIPE DO PROJETO
Verificar a possibilidade de parceria com a SGP para realização de curso de Libras com recursos internos.	02/03/2018	27/07/2018	EQUIPE DO PROJETO
Divulgar a disponibilização de fones de ouvido, inclusive em parceria com a Ascom e Ouvidoria eleitoral.	27/07/2018	06/10/2018	EQUIPE DO PROJETO
ACESSIBILIDADE NO DIA DA VOTAÇÃO			EQUIPE DO PROJETO
Encaminhar aos cartórios eleitorais checklist para organização dos locais de votação, incluindo informações gerais sobre o tema para conhecimento dos coordenadores de LV.	27/07/2018	28/09/2018	EQUIPE DO PROJETO
OUTRAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO			EQUIPE DO PROJETO
Solicitar aos Cartórios que divulguem aos eleitores as ações de acessibilidade nos locais de votação.	27/07/2018	07/09/2018	EQUIPE DO PROJETO

5. PLANO ORÇAMENTÁRIO

Despesas	Status do orçamento	Qtde	Custo Unitário Estimado	Valor Total Estimado
Aquisição de fones de ouvido	Incluída na proposta orçamentária.	500	10	5.000,00
Total		500	10	5.000,00

6. UNIDADES IMPACTADAS

Área Impactada	Descrição do Impacto Previsto
Gabinete DG	Atualização da Resolução sobre atos preparatórios no quesito Acessibilidade.
SAO	Providências relacionadas às contratações.
STI	Providências relacionadas ao sistema Pré-Eleição, levantamento de informações no banco de dados e à distribuição de fones de ouvido.
COEDE	Providências relacionadas à capacitação em libras.
ASCOM	Ações de divulgação e providências relacionadas à contratação, se for o caso.
Zonas Eleitorais	Vistoria dos locais de votação, atualização de dados no Pré-Eleição, oportunidade de mudança de local de votação de eleitores deficientes em local de votação sem acessibilidade ou com acessibilidade parcial. estabelecimento de parcerias em nível municipal para melhorar as condições de acessibilidade dos locais de votação.

7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES
7.1 Premissas
Aprovação de Resolução do TRE-SE sobre atos preparatórios.
Disponibilidade de recursos para a aquisição de fones de ouvido
Implementação das demandas de melhoria no Sistema Pré-Eleição
7.2 Restrições
Recurso aprovado para contratação dos fones.
Data do calendário de contratações.

8. ANÁLISE DOS RISCOS					
IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DOS RISCOS					
Se (Causa)	Então (Efeito)	Probabilidade P	Impacto I	Risco (PxI)	Ações
Não for aprovada Resolução do TRE-SE com determinações sobre acessibilidade.	Dificultará a uniformização para o cumprimento das determinações.	Baixa	Médio	Médio	Sugerir que as orientações sejam encaminhadas por meio de ofício da Presidência
O recurso para aquisição de fones de ouvido for insuficiente.	Não haverá aquisição de novos fones ou o quantitativo será reduzido.	Baixa	Médio	Médio	Reprogramar a distribuição dos fones de acordo com o quantitativo disponível.
As melhorias do sistema Pré-Eleição não forem implementadas.	Dificultará as ações do projeto, quanto ao acompanhamento das vistorias, mas não inviabiliza.	Baixa	Baixo	Médio	Utilizar os recursos disponíveis, complementando com informações e/ou planilhas.
Inação dos Órgãos	Comprometerá a melhoria da acessibilidade nos LV	Média	Muito alto	Extremo	Encaminhar cópia do relatório das vistorias ao PRE e mantê-lo informado
Houver dificuldade na execução das ações previstas para os cartórios	Não haverá alteração do quadro atual	Baixa	Muito alto	Alto	Prever no instrumento normativo o máximo de ações e prazos para sua execução

9. EQUIPE DO PROJETO	
Nome	Unidade
Marcelo Gerard Almeida de Andrade	COPEG
Rosa Márcia Fontes Machado	GAB-DG
Rosa Angélica Almeida Ribera	CRE
Oona Karina	SGP



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO GERARD ALMEIDA DE ANDRADE**, **Analista Judiciário**, em 03/04/2018, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://apps.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **0479434** e o código CRC **94871DE0**.
